



**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
REGIÓN CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 98

La Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 3.1.4.2 del Acuerdo 045 de 2017, previa solicitud del Presidente, convocó el 14 de Octubre de 2020 a sesión de OCAD en modalidad no presencial para el día 22 Octubre de 2020, para ser desarrollada en la misma fecha, a través de la plataforma Microsoft Teams y correo electrónico ocadcaribe@atlantico.gov.co, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m y 6:00 p.m. Durante la sesión no presencial, la Secretaría Técnica presentó el orden del día y los temas a tratar para su consideración y aprobación. Así mismo, se informó a los integrantes e invitados del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es ocadcaribe@atlantico.gov.co. Durante el desarrollo de la sesión, la Secretaría Técnica solicitó prórroga de la sesión hasta las 6:00 p.m. del 23 de octubre de 2020, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 3.1.4.7. del Acuerdo 45 de 2017 que señala: " Las sesiones de los OCAD tendrán una duración de un (1) día, prorrogable una sola vez por el mismo plazo, cuando en la misma sesión así se solicite y aprueben los miembros del OCAD", con el fin de preparar y aprobar el acta, solicitud que fue aprobada de manera unánime.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Regional los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Genoveva Mogollón Jaraba	Departamento de Bolívar	Directora de Planeación Estratégica e Inversión Presidente del OCAD Delegada	Gobierno Departamental, mediante Poder de fecha 21/10/2020 con radicado No. GOBOL-20-035133
2	Camilo Mejía Padilla	Gobernación de Córdoba	Director del Departamento Administrativo de Planeación	Gobierno Departamental, según delegación permanente del 09/03/2020
3	José Gregorio Banda Hoyos	Alcaldía de Chima	Alcalde	Gobierno Municipal
4	Edgar Iván Galvis Pérez	Departamento Nacional de Planeación	Asesor - DSGR	Gobierno Nacional, según Resolución No. 2196 de 21/10/2020
5	Wilfrido Romero Vergara	Alcaldía de San Juan Nepomuceno	Alcalde	Gobierno Municipal

INVITADOS

Representantes a la Cámara

No asistieron a la sesión de OCAD

Senadores

No asistieron a la sesión de OCAD

Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe

Madeline Certain Estripeaut



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



Otros Invitados

Martha Isabel Roa Hernández – Profesional Especializado – Secretaría Técnica OCAD Región Caribe

Jorge Herrera – Secretario de Planeación – Departamento de Sucre

Jhon Freddy Vargas Mayor – Asesor - Grupo Sistema General De Regalías

ORDEN DEL DÍA

El orden del día es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de aprobación de ajuste del siguiente proyecto:
 - 6.1. GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE – BPIN 2019000020066. Cambio de ejecutor y contratante de la interventoría.
7. Solicitud de Liberación de recursos del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA identificado con BPIN 2019000020072.
8. Solicitud de Viabilización, Priorización, Aprobación, Designación de Ejecutor, Designación de entidad encargada de Contratar la Interventoría o Supervisión del siguiente proyecto:
 - 8.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – BPIN 2020000020038.
9. Información al OCAD de ajustes aprobados por ejecutores:
 - 9.1. MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL RAICES - ALTO DE LA VUELTA - BADILLO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – BPIN 2017000020116. Redistribución de costos.
 - 9.2. REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS 2017, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – BPIN 2017000020046. Redistribución de costos.
 - 9.3. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – BPIN 2016000020014. Ajuste No. 1 Redistribución de costos. Ajuste No. 2. Incremento en el valor del proyecto.
10. Propositiones y Varios
11. Aprobación del acta de la sesión



DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 09:40 a.m. del 22 de Octubre de 2020, la Dra. Madelaine Certain Estripeaut, Secretaria Técnica del OCAD Región Caribe, instaló la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria Técnica realizó el llamado a lista y la verificación del quórum, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de Gobierno, con lo que se acreditó la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Para la designación de Voceros, la Secretaria Técnica informa que, de parte del Gobierno Nacional, el vocero es el delegado del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Edgar Iván Galvis Pérez.

Por parte del nivel de Gobierno Departamental, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. Camilo Mejía Padilla, Director del Departamento Administrativo de Planeación del departamento de Córdoba y delegado permanente del Gobernador de Córdoba para participar en las sesiones de OCAD Región Caribe, quien fue el único representante de los gobernadores que se encontraba presente al momento de la verificación del quórum.

De parte del nivel de Gobierno Municipal, el vocero de ese nivel de Gobierno es el Dr. José Gregorio Banda Hoyos, Alcalde del Chima, quien aceptó la postulación que le hiciera el Alcalde de San Juan Nepomuceno, Wilfrido Romero.


2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaria Técnica puso a consideración de los miembros del OCAD el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado de manera unánime.


3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

El estado de los proyectos en el Gesproy con corte al 20 de Octubre de 2020 es el siguiente:

347 PROYECTOS
12 INFLEXIBILIDADES

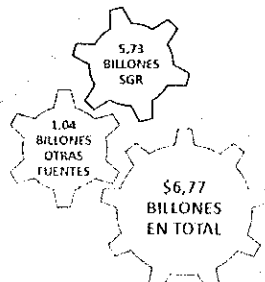

ESTADO DE LOS PROYECTOS CORTE GESPROY: 20 DE OCTUBRE DE 2020

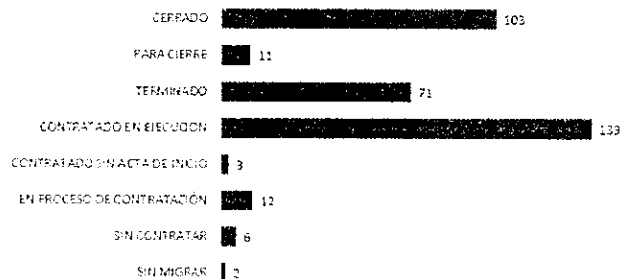



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, realizó la presentación de los proyectos que se encuentran en Proceso de Contratación, Sin Contratar y Sin Migrar y el Estado de Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución de los proyectos para cada uno de los departamentos, los cuales se muestran a continuación:

ATLÁNTICO

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS Y VENTILADORES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	03/03/2020		6/06/2020	La entidad inició el 02 de Junio de 2020 proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante eventos de cotización bajo los números de evento 86956 (Segmento 1: mobiliario escolar) , 86952 (Segmento 2: mobiliario de cocina) y 86957 (Segmento 5 :mobiliario de oficinas administrativas, mantenimiento y recepción), Segmentos correspondientes al acuerdo marco de precios Dotaciones escolares II

BOLÍVAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	04/08/2020		19/12/2020	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	13/07/2020		19/12/2020	



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, consulta con la Dra. Genoveva Mogollón el estado del proyecto "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE 2020, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" quien informa que el proyecto ya fue contratado pero presenta problemas para migrar de SPGR a GESPROY, dicho inconveniente ya fue notificado al Departamento Nacional de Planeación (DNP).

CESAR

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN PRIMER MÓDULO DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL CESAR	08/04/2020		23/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0003338 del 19 de Junio de 2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	17/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 3152 del 20/11/2019, sin embargo el acto administrativo quedó sin efectos.
CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	20/04/2020		19/09/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 0823 del 25/06/2020
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA (COVID 19) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	14/07/2020		23/12/2020	
REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE LA APARTADA		22/03/2021	22/03/2021	



PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN MIGRAR	AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P		6/04/2021	6/04/2021	La entidad no ha aceptado aun la ejecución del proyecto.

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, solicita al Dr. Camilo Mejía información con respecto al cambio de estado en GESPROY del proyecto "CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA", cuyo ejecutor es la Universidad de Córdoba; el Dr. Mejía manifiesta que este proyecto tuvo que aperturar nuevamente el proceso de selección y se espera que adjudiquen esta semana.

Por otro lado, del proyecto recién aprobado "REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", el Dr. Camilo Mejía informa que el municipio de La Apartada se encuentra en trámite de cumplimiento de requisitos de ejecución, la Gobernación de Córdoba está acompañando al municipio en el proceso; así mismo, para el proyecto de "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" la entidad Aguas de Córdoba debe enviar hoy el documento de aceptación de ejecución para que el proyecto pueda migrar y así iniciar el trámite de cumplimiento de requisitos.

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad realizó la invitación del proceso el 6 de julio de 2018
ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y SAN JUAN DEL CESAR (CORREGIMIENTO LA JUNTA), DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE HATONUEVO	08/01/2020		6/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 105 de 17 de Abril de 2020.



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



MAGDALENA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	26/08/2020		29/01/2021	

SAN ANDRÉS

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 262 de 12 de Junio de 2020.
APDOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 Y 3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN MIGRAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		13/07/2021	13/07/2021	



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

SUCRE

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19/06/2020		30/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de contratación de la interventoría mediante Resolución 1613 de 30/06/2020, sin embargo el acto administrativo quedó sin efectos.
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	04/07/2020		23/12/2020	

El Dr. Jorge Herrera, Secretario de Planeación del Departamento de Córdoba indica que tiene información que el proyecto de construcción del estadio 20 de enero ya se contrató la obra y la interventoría se encuentra en proceso. En cuanto al proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE" que fue presentado por la emergencia COVID-19 se va a solicitar su desaprobación, debido a que la pandemia en el departamento ha disminuido y no se hace pertinente la inversión.

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe, recomendó a las entidades actualizar la información de los proyectos en la plataforma Gesproy con el propósito que se vea reflejado el estado actual de los mismos.

4. PRESENTACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

La Secretaría Técnica presentó los saldos de recursos del SGR de los Departamentos de OCAD Región Caribe:

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75



Sistema General de Regalías
ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	3.866.113.254,58
CÓRDOBA	FDR	0,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	0,65
LA GUAJIRA	FCR 60	11.823.793.720,70
LA GUAJIRA	FDR	0,00
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	22.952.068.509,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,90
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo.

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, realizó énfasis especial en el saldo disponible para el departamento de Córdoba, aclarando lo siguiente:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL SALDO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

- Los recursos disponibles para aprobación de proyectos son \$3.866.113.254 del Fondo de Compensación Regional 60%.
- En la presente sesión serán sometidos a consideración del órgano colegiado, una liberación de recursos por \$23.331.422.298 y la aprobación del Programa de Alimentación Escolar – PAE por \$7.996.007.687.
- De acuerdo con lo anterior, la decisión sobre la financiación del PAE estará sujeta a la decisión que el órgano colegiado tome sobre la liberación de recursos.
- Se presentará una nueva diapositiva de saldos luego que el OCAD decida sobre la liberación total de recursos que será sometida a su consideración en el punto 7 del orden del día.

El Dr. Camilo Mejía, vocero del nivel de Gobierno Departamental manifiesta, que la liberación de recursos del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" serían los recursos que financiarían el proyecto PAE, ya que con este se espera garantizar la entrega de los kits de alimentos del próximo mes de noviembre, desde la Gobernación todos los años se solicita al OCAD los recursos para terminar el PAE adicionándolos al contrato que ya viene en ejecución; de no lograrse la liberación no habría opción de llevar a cabo el proyecto PAE.



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



5. PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

La Secretaría Técnica presentó la información del Tablero de Control Presupuestal del departamento con proyectos a tratar en la presente sesión, publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte Agosto de 2020.

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente	Caja acumulada	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja corriente / PBC (1)
CÓRDOBA	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	198.232.632.769	145.433.590.145	71,37%	88,60%

Al respecto, la Secretaría Técnica indicó que el comportamiento de la Caja a Agosto de 2020 para el departamento con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 71%.

En cuanto a la disponibilidad de caja del departamento de Córdoba, la Secretaría Técnica presentó la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la actualización de la información con el último proyecto aprobado:

Fondo	1. Presupuesto Vigente	2. Recaudo Disponible con Apropriación Presupuestal	3. Valor Pendiente por Pagar de Proyectos Aprobados *	4. Caja Disponible para Aprobación de Proyectos
FCR 60%	373.986.632.048,00	166.909.347.930,61	171.206.913.250,73	-4.297.565.320,12

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: 21 de Octubre de 2020 y actualizado con el último proyecto aprobado*

La Ing. Martha Roa, Profesional Especializado de la Gobernación del Atlántico, indicó que la Secretaría Técnica presenta la información de la disponibilidad de caja que el Ministerio de Hacienda pública para proyectos que atiendan la emergencia del COVID-19, los cuales requieren el pago en el corto plazo, durante esta sesión se presenta de manera informativa.

La Ing. Martha Roa, manifestó que en el fondo de compensación regional (FCR 60%) el Dpto. de Córdoba cuenta con un recaudo disponible con apropiación presupuestal de \$166.909.347.930,61 y un valor pendiente por pagar de proyectos aprobados de \$171.206.913.250,73, recalando que este último valor se presenta actualizado incluyendo todos los proyectos que se han aprobado recientemente, así mismo también se incluye el recurso por \$23.331.422,20, que son objetos de decisión sobre la liberación en la presente sesión, por lo que se está reflejando un valor negativo en la disponibilidad; sin embargo, como se ha indicado en otras sesiones, los proyectos que se aprueban no consumen el valor de la caja de manera inmediata, diferentes proyectos que han sido aprobados en las ultimas sesiones tienen ejecución a largo plazo.

Esta información se presenta a manera de referencia. Si la liberación que se va a evaluar mas adelante resulta aprobada, el valor de caja disponible permitiría la disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto PAE.

A este respecto, el Dr. Jhon Vargas Mayor, Asesor de Grupo Sistema General De Regalías, señalo que desde el SPGR se encuentra revisando todos los tramites correspondientes al ajuste y la liberación e indica que ambos procesos, tanto el ajuste presentando en la sesión de hoy por el departamento de Sucre, como la liberación de recursos solicitada por el departamento de Córdoba, requieren de tramites operativos desde el SPGR, en caso de resultar aprobados.



6. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE AJUSTE DEL SIGUIENTE PROYECTO

6.1 SOLICITUD DE CAMBIO DE EJECUTOR Y CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA

La Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe hace la presentación del ajuste al siguiente proyecto:

Código Bpin	Nombre Proyecto	ACUERDO DE APROBACIÓN	Ejecutor y Contratante de la Interventoría Actual	Ejecutor y Contratante de la Interventoría Propuesta
2019000020066	GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Aprobado mediante Acuerdo 086 de 30 de Diciembre de 2019 y corregido mediante Acuerdo No. 88 de 31 de Diciembre de 2019	DEPARTAMENTO DE SUCRE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE

El Dr. Jorge Herrera, Secretario de Planeación del Departamento de Sucre, informa que desde la Gobernación han tomado la decisión que la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE ejecute dicho proyecto ya que se presenta un componente ambiental y la autoridad CARSUCRE cuenta con las capacidades técnicas e idoneidad, desde la dirección de Gestión Ambiental y la Subdirección de Planeación, para llevarlo a cabo, concomitante a esto, la sanción de la nueva ley de Regalías donde se presentan unos fondos de inversión ambiental, generan un escenario ideal para que las corporaciones autónomas ambientales tengan un nuevo rol en las inversiones del sistema, así mismo en los temas de ciencia, tecnología e innovación que están relacionados con asuntos ambientales.

El secretario de Planeación de Sucre señala que, si bien esta corporación no cuenta con asignaciones de regalías, considera importante que desde el rol que maneja dicha corporación sean actores en estos proyectos. Agrega, que desde el OCAD Municipal de Sincelejo hay un proyecto en tránsito donde ellos están aportando unos recursos para un proyecto saneamiento ambiental. Afirmar también que la corporación manifestó su intención de aceptar la ejecución del proyecto y que dicho documento fue anexado junto con la experiencia de la entidad en diferentes proyectos; así mismo, la entidad se compromete a vincular a personal idóneo para seguimiento y correcta ejecución del referido proyecto.

La Ing. Martha Roa, informa que la Secretaría Técnica recibió una aclaración por parte del Departamento de Sucre solicitada por el DNP, en relación con el acompañamiento que la Gobernación puede brindarle a la entidad propuesta como ejecutora.

A esto el Dr. Jorge Herrera indica que desde la Gobernación se realizará el acompañamiento a CARSUCRE.

El vocero del Gobierno Nacional, el Dr. Edgar Galvis manifiesta que desde el DNP solicitan a la Gobernación el acompañamiento durante el proceso por ser nuevos ejecutores, para lograr el éxito del proyecto.

Se somete a consideración del OCAD el ajuste antes citado, con el siguiente resultado:



Sistema General de Regalías
ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



SENTIDO DEL VOTO	APROBACIÓN DE CAMBIO DE EJECUTOR Y CONTRATANTE DE LA INTERVENTORÍA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Con base en la anterior votación, el OCAD SÍ aprobó el cambio de ejecutor y contratante de la interventoría para el proyecto GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE del Departamento de Sucre.

7. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

ENTIDAD EJECUTORA	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR A LIBERAR	JUSTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	2019000020072	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	\$23.331.422.298,00	\$ 14.620.630.830,00 FCR 60%	Para alcanzar la meta propuesta de beneficiarios del proyecto (310) se hace necesario adicionar al presupuesto del proyecto recursos por el orden de los \$1.332.324.000 M/C, suma esta que el Departamento de Córdoba no tiene disponible en sus distintas fuentes de financiación.
				\$ 8.710.791.468,00 FDR	

El Dr. Camilo Mejía señala, que se dio inicio a la selección de este proyecto en octubre de 2019 y en noviembre de ese mismo año fueron publicados los pliegos de condiciones, en el mes de diciembre el proceso se cerró sin recibir propuestas, desde el área jurídica de la Gobernación se informó que la no presentación de propuestas obedeció a que las aseguradoras no estaban de acuerdo con las solicitud de garantías hechas por el Departamento, por lo que el proyecto carece de asegurabilidad, colocando en riesgo los recursos generando una posible responsabilidad fiscal por falta de garantía en los recursos públicos. Durante este año se exploró nuevamente las posibilidades de asegurabilidad, sin embargo, las condiciones de no expedición de pólizas se mantienen. Se presentó la pandemia, ha pasado un año desde la aprobación y los valores de referencia del ganado han variado y ejecutar el proyecto beneficiando a las personas inicialmente consideradas, requería de un ajuste de alrededor del 9% adicional en los recursos con lo que actualmente no se cuenta, esto debido a las prioridades de inversión del departamento, donde uno de los temas sociales es la entrega en casa de paquetes nutricionales, a través del PAE; por lo tanto, se considera pertinente adicionar la entrega del mes de noviembre para así poder finalizar el año escolar y los únicos recursos con lo que se cuenta son los de regalías.



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



Con base en lo anterior el Dr. Camilo Mejía manifiesta la solicitud de liberación de recursos, ya que con las condiciones expuestas anteriormente no había garantías para lograr la asegurabilidad para la ejecución del proyecto.

Se somete a consideración del OCAD la liberación total de recursos, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	SOLICITUD LIBERACIÓN TOTAL DE RECURSOS
NIVEL NACIONAL	NEGATIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Con base en la anterior votación, con dos votos positivos y uno negativo, el OCAD SÍ aprobó la liberación total de recursos del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

El Ing. Edgar Iván Galvis, delegado del Departamento Nacional de Planeación manifiesta que la justificación de su intención de voto se enviará por correo electrónico en la presente sesión, la cual se anexará y hará parte integral de la presente acta.

SALDOS DISPONIBLES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN DEL PROYECTO 2019000020072

Luego de la liberación de recursos aprobada por el OCAD, el nuevo saldo de recursos del departamento de Córdoba es el siguiente:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	18.486.744.084,58
FONDE DE DESARROLLO REGIONAL	8.710.791.468,62

8. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

8.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – BPIN 2020000020038.

La Secretaría Técnica hace la presentación del siguiente proyecto:

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR TOTAL	
2020000020038	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD-FASE 3	\$7.996.007.687,00	
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CÓRDOBA		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$7.996.007.687,00



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Instancia pública propuesta para adelantar la supervisión del proyecto	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$7.996.007.687,00 Fondo de Compensación Regional 60%	Valor Apoyo a la Supervisión y Fuente de Financiación	\$ 0
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	4 meses de ejecución física y financiera	Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod. AC52), según revisión realizada por el DNP		Sistema Evaluación por Puntaje: 48,90 puntos	

El Dr. Camilo Mejía, delegado del departamento de Córdoba, manifestó que estos recursos son importantes para garantizar la entrega de las raciones para preparar en casa a los estudiantes durante el mes de Noviembre.

Se somete a consideración del OCAD el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZADO	PRIORIZADO	APROBADO	EJECUTOR	ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN
NIVEL NACIONAL	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

El Dr. Edgar Iván Galvis, vocero del Gobierno Nacional, indicó que el voto es NEGATIVO, ya que se cuenta con un pronunciamiento de la subdirección de educación del DNP en el mismo sentido, manifiesta que se pudo presentar una confusión con respecto a que el proyecto que pretenden realizar es la continuación de uno que se viene ejecutando.

Con base en la anterior votación, con dos votos positivos y uno negativo, el OCAD Sí viabilizó, Sí priorizó y Sí aprobó el citado proyecto, designó como entidad pública ejecutora a DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, designó como entidad a cargo de la supervisión al DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

9. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

La Secretaría Técnica informa a los miembros del OCAD sobre el ajuste al siguiente realizados por la entidad ejecutora:

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2017000020116	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL RAICES - ALTO DE LA VUELTA - BADILLO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,	REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS	DEPARTAMENTO DEL CESAR	10/06/2019	El ajuste corresponde a una redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos manteniendo el valor del proyecto. Al realizar nuevos apiques a la vía se observó la necesidad de



Sistema General de Regatías
ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
	EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR				realizar la instalación de una carpeta de base granular (BG) clase B en quince centímetros (15 cm) de espesor sobre todo el ancho del tramo de vía a rehabilitar y conservando la estructura propuesta en los diseños para efectos de los sectores en los que se debe realizar ampliación. Así mismo se realizó un análisis hidráulico e hidrológico de la zona que atraviesa el corredor vial correspondiente al proyecto, encontrándose la necesidad de construir más obras de drenaje tipo alcantarilla y la ampliación de las obras de drenaje tipo box couvert contempladas en el presupuesto, con el objetivo de garantizar el correcto drenaje y por ende la protección y estabilidad de la vía que se encuentra en ejecución. También incluye la posibilidad de repotenciar y optimizar la estructura tipo puente militar ubicado a la altura de la abscisa K10+830, mediante un mantenimiento correctivo apropiado. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 07/09/2020.
2017000020046	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS 2017, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	02/10/2018	El ajuste corresponde a una redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos manteniendo el valor del proyecto derivado del balance de mayores y menores cantidades de obras necesarias e indispensables para el cumplimiento del objeto del proyecto. Se incluye el mejoramiento de la subrasante que se realizará con la finalidad de tener un suelo de soporte con capacidad igual o superior al



Sistema General de Regalías
ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
					considerado en el diseño del pavimento, igualmente se busca mejorar la capacidad del suelo de soporte a fin de obtener una base con rigidez uniforme en todo el ancho de la subrasante y evitar deformaciones diferenciales en el pavimento. Además se incluye el retiro de material inadecuado (excavación), el perfilado y compactado del mejoramiento, la adición de material de préstamo, la mezcla, humedecimiento, la conformación del relleno, el perfilado y compactado final a nivel de subrasante de acuerdo con las normas INVIAS cumpliendo con las dimensiones, alineamientos y pendientes señaladas en los planos del proyecto. En las actividades de desmonte y limpieza se registran mayores cantidades ya que el área que ocupará las obras del proyecto para la vía, se encuentra cubiertas de rastrojo, maleza, escombros y basuras. Por último, se incluyó la disposición final. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 25/09/2020.
2016000020014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	20/09/2018	El ajuste corresponde a una redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos manteniendo el valor del proyecto. Se hizo necesario aumentar las cantidades de excavación en material común de la explanación y transporte de material común de la explanación debido a que se incluyeron excavaciones para el mejoramiento y garantizar la estabilidad de la loza de concreto, construcción de juntas transversales, acero para dovelas de transmisión de cargas, acero para barras de anclaje, entre



Sistema General de Regalías
ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
					otras, atendiendo las especificaciones técnicas del diseño de la estructura. Se disminuyeron cantidades de Suministro e Instalación de concreto hidráulico de 41 Kg/cm² para losas de pavimento atendiendo el diseño de la estructura y replanteo topográfico y de Bordillo en concreto anclado a losa atendiendo la petición de la comunidad que considera un peligro la construcción de este elemento estructural, por lo que se considera la construcción de berna pequeñas con funciones de confinamiento lateral. Se disminuyeron cantidades y se plantearon como ítems no previstos el material de relleno o terraplén dado que en el APU se pudo verificar que se tenía contemplado una distancia de acarreo de 20 km para el material seleccionado y para esta distancia, a cantera de extracción (La Salada) no garantizaba la producción para el suministro del material a emplear, por tal motivo, se obligó a buscar otra cantera y la más cercana a la zona del proyecto se encontraba a 35 km. Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 13/08/2020.



Sistema General de Regalías
ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	EJECUTOR	FECHA DE APROBACIÓN DEL AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
2016000020014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	INCREMENTO EN EL VALOR DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	20/02/2019	El ajuste se presenta por la necesidad, oportunidad y conveniencia de construir una placa de aproximación al puente existente, ubicado al final del tramo de la placa huella a ejecutar en el Corregimiento de El Floral en el municipio de Montería, de tal forma que se protejan ambas estructuras y se brinde la estabilidad necesaria a las obras entregadas. Así mismo, se construirán bordillos de confinamiento para la estructura de la placa huella toda vez que la longitud total de la vía corresponde a una sección en terrapién y no presenta secciones en corte que ameriten bermas, cunetas y la sección transversal, revisada y aprobada que responde a las necesidades de la vía, soporta las cantidades de obra solicitadas. El valor del proyecto se incrementó en \$103.602.878,00. El valor total del proyecto es \$20.758.423.896,00 Nota: Ajuste presentado de manera extemporánea a la Secretaría Técnica el 11/09/2020.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hay proposiciones y varios

11. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

La Secretaría Técnica puso a consideración de los voceros de los diferentes niveles de gobierno, el Acta de la presente Sesión para su aprobación, con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO	SENTIDO DEL VOTO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Con base en la anterior votación, el OCAD SÍ aprobó el acta de la presente sesión.



Sistema General de Regalías

ACTA No. 98 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020



Agoñado el orden del día, siendo las 04:40 p.m. del 23 de Octubre de 2020 se dio por terminada la sesión no presencial del OCAD Región Caribe.

ANEXOS

Anexo 1. Actos Administrativos de delegación de los diferentes niveles de Gobierno

Anexo 2. Presentación de los temas a tratar

Anexo 3. Documento Aclaratorio CARSUCRE

Anexo 4. Votos del Gobierno Nacional

Anexo 5. Votos del Vocero del nivel de Gobierno Departamental

Anexo 6. Votos del Vocero del nivel de Gobierno Municipal

Anexo 7. Citación de la sesión

Se firma los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2020.

GENOVEVA MOGOLLÓN JARABA

Directora de Planeación Estratégica e Inversión del departamento de Bolívar

PRESIDENTE DELEGADA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE

mediante Poder de fecha 21/10/2020 con radicado No. GOBOL-20-035133

MADELAINE CERTAIN ESTRYPEAUT

Secretaria de Planeación del departamento del Atlántico

SECRETARIA TÉCNICA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN REGIÓN CARIBE
