

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD REGIÓN CARIBE

Sesión No Presencial No. 101
18 de Diciembre de 2020



1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

GOBERNADORES

- Atlántico - Elsa Noguera De la Espriella
- Bolívar - Vicente Blel Scaff
- Cesar - Luis Alberto Monsalvo Gnecco
- Córdoba - Orlando Benítez Mora
- La Guajira – Nemesio Roys
- Magdalena- Carlos Caicedo
- San Andrés, Providencia – Alen Jay Stephens (E)
- Sucre - Héctor Olimpo Espinosa

GOBIERNO NACIONAL

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Jonathan Malagón
- Ministerio de Transporte - Ángela María Orozco
- Ministerio de Ambiente y Dlo. Sostenible – Ricardo Lozano
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Alberto Carrasquilla
- Departamento Nacional de Planeación – Luis Alberto Rodríguez (**Líder**)

INVITADOS PERMANENTES

- Representante Christian Moreno
- Representante Héctor Vergara
- Senador José David Name Cardozo
- Senador Eduardo Enrique Pulgar Daza

ALCALDES – 2020

- Sabanagrande – Gustavo De la Rosa Berdejo
- Sabanalarga – Jorge Manotas Manotas
- San Juan Nepomuceno – Wilfrido Romero Vergara
- Hatillo de Loba – Oledis Arias Jiménez
- Chiriguaná – Carlos Caamaño Cuadro
- Valledupar – Mello Castro González
- Buenavista – Félix Gutiérrez Córdoba
- Chimá – Jose Banda Hoyos
- Montería – Carlos Ordosgoitia
- Dibulla – Marlon Amaya Mejía
- La Jagua del Pilar – Waldin Soto Durán
- Ariguaní – David Farelo Daza
- El Retén – Jorge Serrano Casalins
- Providencia – Jorge Gari Hooker
- San Marcos – Anuar Arabia ortega
- San Pedro – Jesús García Piña

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Definición de Voceros

Solicitud a Miembros del OCAD:

El Alcalde de Pueblo Bello, Dr. Danilo Duque Varón, el día 16 de Diciembre presentó solicitud al OCAD Región Caribe para participar como invitado a la sesión de este Órgano Colegiado.

SOLICITUDES DE RETIRO

La Secretaría Técnica se permite informar las solicitudes de retiro realizadas por las entidades territoriales con el fin de atender las observaciones de la Dirección del Sistema General de Regalías y/o de los Ministerios Sectoriales:

- MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA-LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2018000020067
- CONSTRUCCIÓN DE LA CONCHA ACÚSTICA DEPARTAMENTAL EN LA SEDE CULTURAL BANDA DE BARANOA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2019000020020
- CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2018000020058
- MEJORAMIENTO DE LA VIA CERRITO - HIBACHARO, MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2019002080026
- MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE Bolívar – BPIN 2019000020015
- MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA SINCÉ - GRANADA - BUENAVISTA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE – BPIN 2018000020002

Por lo anterior, dichos ajustes no serán incluidos en el orden del día de la presente sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se han sometido a consideración o en trámite del OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora
4. Presentación de Saldos disponibles por fuente de financiación
5. Presentación de Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto
6. Solicitud de Aprobación de ajustes para incrementar los valores de los recursos provenientes del SGR solicitados por las entidades que presentaron los siguientes proyectos al OCAD:

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – BPIN 2019000020008

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN 2019000020069.

DEPARTAMENTO DE SUCRE


- REHABILITACIÓN DE LA VÍA LAS MAJAGUAS - LA ARENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE – BPIN 2017000020114

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA


7. Solicitud de Viabilización, Priorización y Aprobación, Designación de Ejecutor, Designación de entidad encargada de Contratar la Interventoría o Supervisión de los siguientes proyectos:
 - 7.1 DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ PUEBLO BELLO SAN DIEGO MANAURE CESAR– BPIN 2020000020045. Puntaje: 51,00
 - 7.2 ADQUISICIÓN DE TOMOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS – BPIN 2020000020042. PUNTAJE: 60,3. SE SOLICITA APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN.
8. Información al OCAD de Ajustes aprobados por ejecutores de proyectos de inversión aprobados.
9. Información al OCAD de Actos Administrativos expedidos por la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP
10. Propositiones y Varios

3. INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE SE HAN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN O EN TRÁMITE DEL OCAD, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS Y EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN RECTORA

350 PROYECTOS
12 INFLEXIBILIDADES

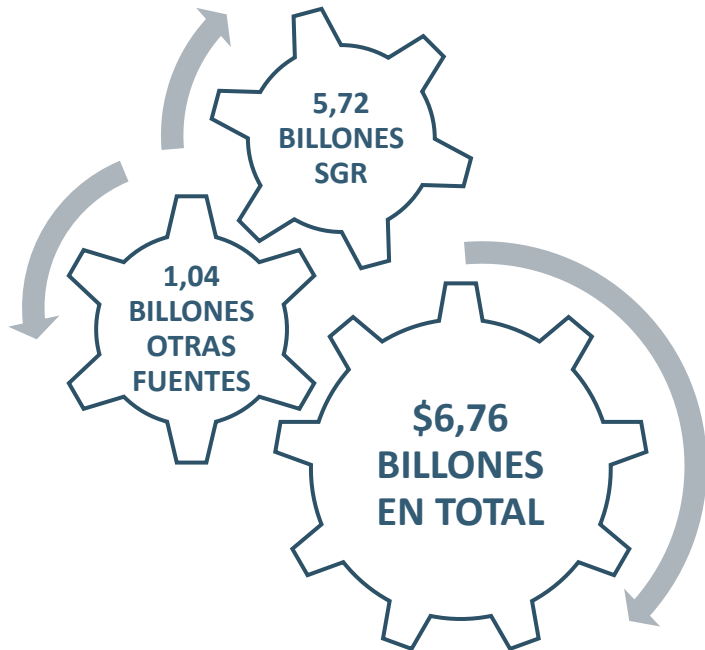

ESTADO DE LOS PROYECTOS CORTE GESPROY: 15 DE DICIEMBRE DE 2020

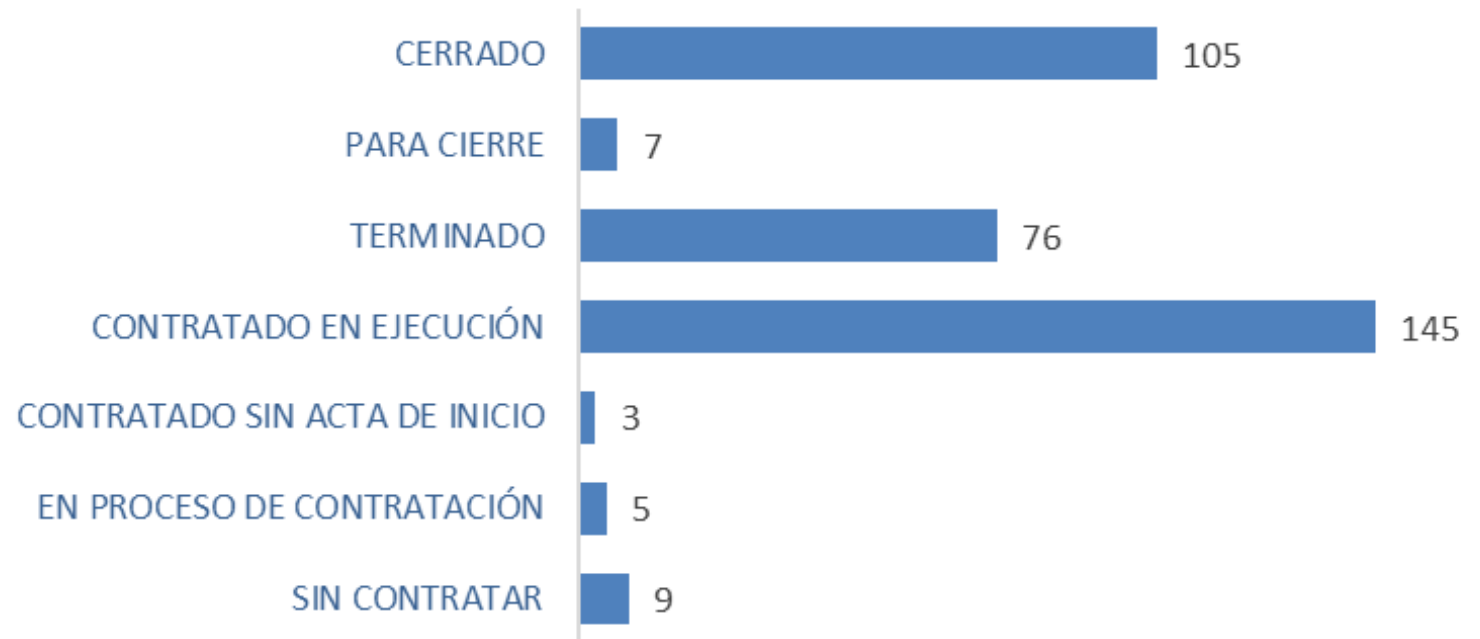

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 15/12/2020

CÓRDOBA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA (COVID 19) EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	14/07/2020		23/12/2020	La entidad ordenó la celebración de un contrato con cargo a los recursos del proyecto según Resolución SDEA-007 del 23 de noviembre de 2020
REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VÍA APARTADA MONTELÍBANO MONTELÍBANO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE LA APARTADA	28/10/2020		22/03/2021	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 176 de 13 de noviembre de 2020.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.		07/04/2021	07/04/2021	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR
Corte GESPROY: 15/12/2020

LA GUAJIRA

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	09/04/2018		09/07/2018	La entidad realizó la invitación del proceso el 06 de julio de 2018
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	23/11/2020		13/05/2021	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 15/12/2020

SAN ANDRÉS

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/3/2018		15/06/2018	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante resolución 005077 del 15/06/2018.
FORMULACIÓN Y DISEÑOS EN DETALLE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	04/10/2019		01/04/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 842 de 22 de Noviembre de 2019
GENERACIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA LIMPIA SANTA CATALINA VERDE, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	17/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 262 de 12 de Junio de 2020.
ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS CAUSAS DE LA EMERGENCIA O CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA COVID-19 EN PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	11/11/2020		27/04/2021	
APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LOS USUARIOS DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	09/11/2020		27/04/2021	

ESTADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN, PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, SIN CONTRATAR Y SIN MIGRAR

Corte GESPROY: 15/12/2020

SUCRE

PROYECTO	ESTADO	EJECUTOR	FECHA REQUISITOS EJECUCIÓN	PLAZO PARA CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN	PLAZO PARA EXPEDIR ACTO ADM APERTURA PROCESO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN ESTADIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	MUNICIPIO DE SINCELEJO	30/12/2019		13/06/2020	La entidad dio apertura al proceso de selección mediante Resolución No. 0063 de Enero 22 de 2020
GENERACIÓN DE PLAYAS MEDIANTE RELLENO MECÁNICO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ Y DEL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	CARSUCRE	19/06/2020		30/06/2020	El OCAD aprobó el 22/10/2020 el cambio de ejecutor del proyecto. El ejecutor anterior, Departamento de Sucre, cumplió con los plazos para aperturar el proceso y el acto administrativo para ese proceso quedó sin efectos
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	SIN CONTRATAR	DEPARTAMENTO DE SUCRE	04/07/2020		23/12/2020	

4. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
ATLANTICO	FCR 60	12.655.394.219,00
ATLANTICO	FDR	32.267.755.039,38
ATLANTICO	FDR - GRIESGO	-
ATLANTICO	FDR - PAZ	1,53
BOLIVAR	FCR 60	4.052.907.465,36
BOLIVAR	FDR	6.114.992.228,52
BOLIVAR	FDR - GRIESGO	224.004,15
BOLIVAR	FDR - PAZ	418.399.904,95
CESAR	FCR 60	28.524.776.060,75
CESAR	FDR	1.677.709.792,13
CESAR	FDR - GRIESGO	78.840.430,20
CESAR	FDR - PAZ	0,30
CÓRDOBA	FCR 60	10.490.736.397,58
CÓRDOBA	FDR	8.710.791.468,62
CÓRDOBA	FDR - GRIESGO	1.827.662,00
CÓRDOBA	FDR - PAZ	0,65

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	SALDOS
LA GUAJIRA	FCR 60	4.499.048.574,70
LA GUAJIRA	FDR	(0,00)
LA GUAJIRA	FDR - GRIESGO	80.258.769,00
LA GUAJIRA	FDR - PAZ	488.071.509,07
MAGDALENA	FCR 60	122.099.140.595,55
MAGDALENA	FDR	25.764.905.365,21
MAGDALENA	FDR - GRIESGO	15.508.775,00
MAGDALENA	FDR - PAZ	75.859.292,87
SUCRE	FCR 60	81.570.668.033,77
SUCRE	FDR	6.999.894.900,21
SUCRE	FDR - GRIESGO	2.266.844.830,00
SUCRE	FDR - PAZ	29.551.048,27
SAN ANDRÉS	FCR 60	18.820.687.078,93
SAN ANDRÉS	FDR	24.145.230.286,97
SAN ANDRÉS	FDR - GRIESGO	4.043.882.412,00
SAN ANDRÉS	FDR - PAZ	17.742.968.438,18

Fuente: Ley 1942 de 2018 – Presupuesto del SGR del bienio 2019 – 2020, Decreto de Cierre del Bienio 2017 – 2018 No. 606 del 5 de abril de 2019, liberación según Acuerdo 55 de 2019 de Comisión Rectora del SGR y según Plan Nacional de Desarrollo, Decreto 1131/2019 - Compensación Asignaciones Directas

5. INDICADORES DE CONTROL DE CAJA QUE FINANCIA EL PRESUPUESTO

Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente	Caja acumulada	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja Caja corriente / PBC (1)
ATLÁNTICO	FDR	INGRESO CORRIENTE	147.481.675.243	114.886.284.772	77,90%	85,19%
BOLÍVAR	FDR	INGRESO CORRIENTE	79.521.368.900	56.659.096.698	71,25%	78,00%
CESAR	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	142.623.880.302	110.736.465.055	77,64%	84,91%
SAN ANDRÉS	FDR	INGRESO CORRIENTE	21.851.232.575	17.012.916.528	77,86%	85,14%
SUCRE	FCR 60%	INGRESO CORRIENTE	143.461.345.897	111.478.855.423	77,71%	84,98%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte: Octubre de 2020.

El comportamiento de la Caja a Octubre de 2020 para los departamentos con proyectos a aprobar en la presente sesión está alrededor del 77%, lo que indica un buen comportamiento de recaudo para la financiación de los proyectos que serán sometidos en la presente sesión.

(1) Indica cómo se ha cumplido el plan bienal mensual de caja.

6. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE AJUSTES DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

BPIN 2019000020008 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ATLÁNTICO



PRESENTADO POR

Departamento de Atlántico

EJECUTOR

Departamento de Atlántico

INCREMENTO

19,87 %

TIPO DE AJUSTE

Incremento en el valor de los recursos del SGR

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

\$11.972 millones

AJUSTES ANTERIORES

No registra

RECURSOS AJUSTE ACTUAL

\$2.379 millones

Fondo de Desarrollo Regional

VALOR FINAL AJUSTADO

\$14.351 millones

DESCRIPCIÓN

El ajuste en el componente de Ponedera consiste en el mejoramiento de la vía en su geometría y estructura, toda vez que es necesario por cuanto fueron hallados rellenos profundos de basura y arcillas de baja capacidad las cuales no fueron identificadas dentro de los estudios iniciales de suelos; es así como se requiere realizar dentro del ajuste solicitado un alineamiento de la vía teniendo en cuenta las cotas del sistema de alcantarillado y el reforzamiento de la estructura vial en un sector con un pedraplén. De igual manera, se rediseñó la cimentación del muro perimetral del parque. En cuanto a Usiacurí, se identificó variaciones de la geometría y topografía del terreno, lo que llevó a realizar un replanteo en cuanto a la planimetría de las áreas de las plazas conservando las metas del proyecto, evidenciando la necesidad de la construcción de un muro de contención con el fin garantizar la estabilidad de las obras, las cuales evitan el deslizamiento de la ladera en la base del cerro y posibles inundaciones del arroyo. Adicionalmente, se observó cambios en el cauce del arroyo lo que llevó a replantear como alternativa el diseño inicial que contemplaba un box coulvert por un puente peatonal, garantizando la estabilidad y seguridad de la obra por posibles inundaciones.

FOTOS

6.1 SOLICITUD DE AJUSTE PARA APROBACIÓN DEL OCAD DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase		Ajuste Solicitado
2019000020008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD – FASE 3		Incremento en el valor de los recursos del SGR
Fuentes		Tipo de recurso	Vigencia Presupuestal	Valor Inicial	Valor de Ajuste Solicitado	Totales
DEPARTAMENTOS – ATLÁNTICO		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2019 – 2020	\$11.972.017.936,00	\$2.379.390.774,13	\$14.351.408.710,13
Entidad que presentó el proyecto: DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO Ejecutor y Contratante de la Interventoría del Proyecto: DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO			Totales	\$11.972.017.936,00	\$2.379.390.774,13	\$14.351.408.710,13
Proyecto aprobado mediante Acuerdo 077 de 01 de Octubre de 2019. El porcentaje de incremento con recursos SGR es de 19,87%						

BPIN 2019000020069 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

BOLÍVAR



PRESENTADO POR

Departamento de Bolívar

EJECUTOR

Departamento de Bolívar

INCREMENTO

11,54%

TIPO DE AJUSTE

Incremento en el valor de los recursos del SGR



VALOR INICIAL DEL PROYECTO

\$17.005 millones



AJUSTES ANTERIORES

No registra



RECURSOS AJUSTE ACTUAL

\$1.962 millones
Fondo de Desarrollo Regional



VALOR FINAL AJUSTADO

\$18.967 millones

DESCRIPCIÓN

Estas razones técnicas dan motivo al ajuste se agrupan en la categoría de mayores y menores cantidades de obra e ítem de obras complementarias, indispensables e inseparables para el cumplimiento del proyecto. En el Puente No. 7 sobre Caño Cueto se requiere la ejecución de obras complementarias y mayores cantidades ya que las condiciones iniciales consideradas el diseño hidráulico y de acuerdo con la revisión en campo, los niveles de creciente intermedio con datos de la comunidad alcanzan un valor promedio de 17.86m, mientras que el nivel de creciente máxima según diseños es de 13.75m. Esta discrepancia entre los niveles máximo, ocurre porque Caño Cueto funciona como un vaso comunicante en el sistema cenagoso existente, por lo cual, no es posible definir un área aportante en el sentido tradicional, así como tampoco se puede definir el alineamiento del cauce principal, debido a las características de divagación y dinámica asociada a este tipo de sistema. Además, se requiere de una cimentación especial (terraplén que incluya un mejoramiento con pedraplén) para aumentar la capacidad de soporte para garantizar la estabilidad de los accesos. También se propone la construcción de muros en gavión en ambos costados para el Puente No. 8 (El Chorro).

FOTOS



6.2 SOLICITUD DE AJUSTE PARA APROBACIÓN DEL OCAD DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase		Ajuste Solicitado
2019000020069	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR LA PAZ II, MUNICIPIOS DE MAHATES, EL GUAMO, CALAMAR, BARRANCO DE LOBA, MARGARITA Y MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD – FASE 3		Incremento en el valor de los recursos del SGR
Fuentes		Tipo de recurso	Vigencia Presupuestal	Valor Inicial	Valor de Ajuste Solicitado	Totales
DEPARTAMENTOS – BOLÍVAR		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2019 – 2020	\$17.005.673.599,00	\$1.962.012.415,00	\$18.967.686.014,00
Entidad que presentó el proyecto: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Ejecutor y Contratante de la Interventoría del Proyecto: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			Totales	\$17.005.673.599,00	\$1.962.012.415,00	\$18.967.686.014,00
Proyecto aprobado mediante Acuerdo 079 de 21 de Octubre de 2019. El porcentaje de incremento total con recursos SGR es de 11,54%						

BPIN 2017000020114 REHABILITACIÓN DE LA VÍA LAS MAJAGUAS - LA ARENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SUCRE



PRESENTADO POR

Departamento de Sucre

EJECUTOR

Municipio de Sincelejo

INCREMENTO

19,99%

TIPO DE AJUSTE

Incremento en el valor de los recursos del SGR

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

\$13.412 millones

AJUSTES ANTERIORES

No registra

RECURSOS AJUSTE ACTUAL

\$2.682 millones

Fondo de Compensación Regional 60%

VALOR FINAL AJUSTADO

\$16.094 millones

DESCRIPCIÓN

El ajuste se realiza debido a algunas discrepancias en la materialización de los diseños en campo, lo que dio origen a la necesidad de ajustar la topografía base y el diseño geométrico de la vía ya que no fue posible tomar como base las cotas proyectadas en los diseños iniciales. Se originan mayores y menores cantidades e ítems no previstos con el fin de garantizar la funcionalidad, estabilidad y calidad de la obra. Se disminuyen cantidades de demolición de pavimento asfáltico ya que se determinó que el espesor promedio de la carpeta asfáltica existente de 7 a 8 cm, mayores cantidades de demolición de andenes y/o cunetas en concreto, demolición de alcantarillas, demolición de box culvert y pontones. Para el caso de Excavación en material común de la explanación y canales (incluye derecho botadero) se identificó la necesidad de ajustar el alineamiento vertical en 4 zonas específicas porque los niveles de los parámetros existentes no permiten que el nivel de la carpeta nueva quede por encima de la existente. Adicionalmente, se presentan menores cantidades de rellenos con material seleccionado y aumento en la subbase granular por cambios en las secciones transversales debido al alineamiento vertical del proyecto. También se originaron mayores cantidades en la estructura de pavimento, sobreanchos en ambos costados de la vía para ejecución de riego de imprimación con asfalto líquido, aumento en las obras de arte debido a ampliación de las longitudes de cunetas, adición de vástagos en aletas, aumento en la altura de los bordillos.

FOTOS

6.3 SOLICITUD DE AJUSTE PARA APROBACIÓN DEL OCAD DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase		Ajuste Solicitado
2017000020114	REHABILITACIÓN DE LA VÍA LAS MAJAGUAS - LA ARENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE		TRANSPORTE	FACTIBILIDAD – FASE 3		Incremento en el valor de los recursos del SGR
Fuentes		Tipo de recurso	Vigencia Presupuestal	Valor Inicial	Valor de Ajuste Solicitado	Totales
DEPARTAMENTOS – SUCRE		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	2017 – 2018	\$12.720.028.763,96	-	\$12.720.028.763,96
DEPARTAMENTOS – SUCRE		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	2017 – 2018	\$ 692.179.634,04	-	\$ 692.179.634,04
DEPARTAMENTOS – SUCRE		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	2019 – 2020	-	\$2.682.441.679,00	\$2.682.441.679,00
Entidad que presentó el proyecto: DEPARTAMENTO DE SUCRE Ejecutor y Contratante de la Interventoría del Proyecto: MUNICIPIO DE SINCELEJO			Totales	\$ 13.412.208.398,00	\$2.682.441.679,00	\$16.094.650.077,00
Proyecto aprobado mediante Acuerdo 060 de 16 de Octubre de 2018. El porcentaje de incremento con recursos SGR es de 19,99%.						

7. SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS

Notas

El IGPR- índice de gestión de proyectos que es un insumo para la toma de decisiones del OCAD y que se mostrará en la presentación es con corte a **30 de Junio de 2020**, publicado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

BPIN 2020000020045 DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ PUEBLO BELLO SAN DIEGO MANAURE CESAR

CESAR



**EJECUTOR
PROPUESTO**

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

IGPR

Resultado

69,52

Medio

**INCLUSIÓN
SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN**

760

apoyos a unidades
productivas individuales
para la generación de
ingresos

**VALOR TOTAL
DEL PROYECTO**

\$12.012

millones

**RECURSOS DEL
OCAD CARIBE**

\$12.012

millones

Fondo de Compensación
Regional 60%

BENEFICIARIOS

2.000

PUNTAJE

51,00

DESCRIPCIÓN

El objetivo general busca mejorar la capacidad de generación de ingresos de la población vulnerable y/o pobreza monetaria a través de acciones en materia de emprendimiento, fortalecimiento empresarial y acceso a mercados que permitirá la creación, fortalecimiento empresarial y acceso a mercados, teniendo en cuenta que se ha venido trabajando en los municipios de Manaure, Pueblo Bello, Sandiego y La Paz este tipo de iniciativas para la generación de ingresos, así como la articulación de otros sectores que contribuyan a la sostenibilidad de la inversión. Para su implementación, se ejecutarán actividades como Jornadas de socialización del alcance del proyecto, Realización de talleres para la generación de competencia emprendedora y Realización de talleres para la competencia empresarial y educación financiera; a partir de este componente se fortalecerán las capacidades de la población objetivo permitiéndoles desarrollar iniciativas de negocio y/o vincularse en las diferentes acciones y mecanismos para la creación, fortalecimiento y expansión empresarial. Además actividades para Fortalecer la estrategia comercial de las empresas apoyadas (760 planes comerciales formulados), Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes y/o emprendimientos apoyados y Realización y participación en ruedas de negocios regional y local para el fortalecimiento comercial de las mipymes apoyadas

FOTOS

7.1 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR Y ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2020000020045	DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ PUEBLO BELLO SAN DIEGO MANAURE CESAR		INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	FACTIBILIDAD- FASE 3	\$ 12.012.362.265,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – CESAR		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		2019 – 2020	\$ 12.012.362.265,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO		Instancia pública propuesta para adelantar la Supervisión del proyecto	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$ 11.716.769.145,00 Fondo de Compensación Regional 60%		Valor Apoyo a la Supervisión y Fuente de Financiación	\$ 295.593.120,00 Fondo de Compensación Regional 60%	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	16 mes de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod AC 57), según Verificación realizada por DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 51,00		

BPIN 2020000020042 ADQUISICIÓN DE TOMOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS

SAN ANDRÉS



EJECUTOR PROPUESTO

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS

IGPR

Resultado

34,90

Bajo

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

1
elemento de
dotación hospitalaria

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$1.924
millones

RECURSOS DEL OCAD CARIBE

\$1.924
millones
Fondo de Desarrollo Regional

BENEFICIARIOS

79.693

PUNTAJE

60,30

DESCRIPCIÓN

Con la alternativa se pretende adquirir un Tómodafo para implementar el servicio de tomografía axial computarizada multicorte que permita brindar oportunidad, acceso, especificidad y el diagnóstico, manejo, tratamiento y mejorar el pronóstico de pacientes con patologías circulares, traumáticas y violentas. Se fortalecerá el Hospital departamental de San Andrés Isla con la adquisición y puesta en funcionamiento de un equipo de tomografía axial computarizada multicorte.

Descripción técnica: 64 detectores físicos/canales o más para diagnóstico radiográfico, Imágenes 2D y volúmenes 3D, Interface Dicom 3.0 , incluyendo: Dicom Print, Modality Worklist, MPPS, Storage Commitment, Dicom Viewer, Módulo de control remoto para gantry, mesa e interface de usuario, Apertura del Gantry : 70 cm o mayor, Angulo de inclinación del Gantry : de -30 a + 30 grados o mayor, Generador de rayos x de 70 kw o superior, Panel de control para el posicionamiento del paciente por método remoto o al lado del gantry, Luz Laser en eje sagital, vertical y horizontal para posicionamiento del paciente o laser sagital y coronal para posicionamiento del paciente vertical y horizontal, Tiempo de rotación : 0.5 segundos o menor Capacidad calórica del tubo de rayos X o valores equivalentes por método iterativo de reducción de dosis entre 7 MHU a 8 MHU Voltaje seleccionable: Entre 80 y 140 KV con mínimo tres voltajes seleccionables.

FOTOS



7.2 SOLICITUD DE VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE EJECUTOR Y ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
2020000020042	ADQUISICIÓN DE TOMOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS		SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	FACTIBILIDAD- FASE 3	\$ 1.924.000.000,00
Fuentes		Tipo de recurso		Vigencia Presupuestal	Valor
DEPARTAMENTOS – SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA		FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		2019 – 2020	\$ 1.924.000.000,00
Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		Instancia pública propuesta para adelantar la Supervisión del proyecto	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
Valor Ejecución y Fuente de Financiación	\$ 1.924.000.000,00 Fondo de Desarrollo Regional		Valor Apoyo a la Supervisión y Fuente de Financiación	\$0	
Plazo de Ejecución Física y Financiera del Proyecto	3 mes de ejecución física y financiera		Bienio en el que se recibe el bien o servicio	2021 – 2022 Se solicita aprobación de Vigencias Futuras de Ejecución	
Cumplió requisitos de Acuerdo 45 (Mod AC 52), según Verificación realizada por DNP			Sistema Evaluación por Puntaje: 60,30		

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR EJECUTORES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
SUCRE	2016000020007	REHABILITACIÓN DE LA VIA SUCRE - LA GUARIPA - EL CAUCHAL, MUNICIPIOS DE SUCRE, MAJAGUAL Y SAN BENITO ABAD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Redistribución de Costos.	Ajuste No. 1. El ajuste consiste en la actualización de los diseños y cálculos para la construcción de los puentes Caño Chule, Caño Mojana, Caracucha o Miraflores y Bajo La Pureza debido a que estos fueron diseñados bajo el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes (CCP 95) que fue actualizado por la Norma Técnica Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14). Los diseños ajustados arrojaron modificaciones en las cantidades de obra y, por ende, nuevos ítems que no se habían contemplado en el proyecto aprobado. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 23 de Noviembre de 2018 e informado a esta Secretaría Técnica el 27 de Octubre de 2020.
CÓRDOBA	2016000020014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Incremento en el valor del proyecto con recursos propios.	Ajuste No. 3. El ajuste corresponde a la inclusión de obras hidráulicas en el tramo Carretera Canalete – Cruce Ruta 74 como Box Coulvert en el K0+736 y un Puente de 15,5 m en el K2+090 porque el Box Coulvert existente en esta abscisa se encuentra deteriorado, una aleta se encuentra desprendida y la sección hidráulica no es suficiente para la evacuación de la escorrentía producida por las fuertes lluvias. Adicionalmente, en el tramo Carretera San Bernardo del Viento – Moñitos se realizó un balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos por la necesidad de proteger taludes de terraplén por erosión por escurrimiento de agua y acelerar las placas de pavimento ubicadas frente a la estación de suministro Gas Domiciliario en el municipio de Moñitos, la cual se abastece cada 5 o 7 días. Se concedió una prórroga de dos (2) meses para la ejecución del contrato. Por lo anterior, se requirió un incremento en el valor de la interventoría. El valor del proyecto se incrementó en \$1.783.060.464. El valor total del proyecto es de \$22.541.484.360. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 05 de Abril de 2019 e informado a esta Secretaría Técnica el 19 de Octubre de 2020.

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
CÓRDOBA	2016000020014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Incremento en el valor del proyecto con recursos propios.	Ajuste No. 4. El ajuste corresponde a un incremento en el valor de la interventoría con el fin de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de las obras ejecutadas en el proyecto teniendo en cuenta la prórroga otorgada hasta el 23 de Noviembre de 2019 al contratista de obra. El valor del proyecto se incrementó en \$206.905.010. El valor total del proyecto es de \$22.748.389.370 El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 30 de Agosto de 2019 e informado a esta Secretaría Técnica el 11 de Noviembre de 2020.
			Redistribución de costos e Incremento en el valor del proyecto con recursos propios.	Ajuste No. 5. El ajuste corresponde a un incremento en el valor de la interventoría con el fin de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de las obras ejecutadas en el proyecto teniendo en cuenta la prórroga otorgada de 3 meses y 15 días. El valor del proyecto se incrementó en \$258.000.000. El valor total del proyecto es de \$23.006.389.370 El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 23 de Junio de 2020 e informado a esta Secretaría Técnica el 17 de Noviembre de 2020.
CESAR	2017000020027	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBSEDE DEL SENA EN LOS MUNICIPIOS DE CURUMANÍ, BOSCONIA, CHIRIGUANÁ, SAN ALBERTO Y CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Redistribución de costos	Ajuste No. 2. El ajuste corresponde a un balance de mayores y menores cantidades así como la inclusión de actividades no previstas inicialmente debido a cambios en algunos acabados en aras de disminuir los costos de mantenimiento posteriores, disminución de secciones de la cimentación y columnas al igual que la optimización (modificación de la especificación) de la estructura metálica de cubierta, optimización de la red contra incendio y el diseño estructural del tanque de almacenamiento. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 26 de Julio de 2018 e informado a esta Secretaría Técnica el 09 de Noviembre de 2020.

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
ATLÁNTICO	2017000020089	AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA REGIONAL BARANOA - POLONUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Incremento en el valor del proyecto con recursos propios	Ajuste No. 2. El ajuste consiste en la inclusión de mayores cantidades de obra e ítems no previstos derivados del rediseño del Sedimentador Tipo Manto de Lodos (Accelator) ya que con los diseños actuales la planta cuenta con capacidad para producir 88 litros por segundo, sin embargo, en el proyecto se requiere producir 100 litros por segundo. El valor del proyecto se incrementó en \$707.261.350. El valor total del proyecto es de \$22.615.885.134
SINCÉ	2018000020002	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA SINCÉ - GRANADA - BUENAVISTA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Incremento en el valor del proyecto con recursos propios	Ajuste No. 1. El ajuste se realiza en aras de brindar la mejor solución vial a los usuarios de la vía teniendo en cuenta que los estudios y diseños iniciales presentaban inconsistencias en cuanto al trazado, alineamiento vertical, estudios hidrológicos y no existía amojonamiento permanente del proyecto. Por lo anterior, se hizo necesario realizar un balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos como Desmonte y limpieza de zonas boscosas, excavación de material común, terraplenes, suministro de material para terraplenes, transporte, entre otros. El valor del proyecto se incrementó en \$8.559.008.426. El valor total del proyecto es de \$53.846.119.444.
BOLÍVAR	2018000020008	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCION Y ADAPTACION QUE PERMITAN EL MANEJO DE LAS INUNDACIONES DEL ARROYO ALFEREZ EN LA REGION MONTEMARIANA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Redistribución de costos	Ajuste No. 3. El ajuste corresponde a mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos los cuales han sido identificados, evaluados y analizados durante la ejecución de la obra y obedecen a las recomendaciones dadas por los especialistas estructurales e hidráulicos del proyecto con la intención de optimizar el diseño de las obras complementarias como lo son los disipadores, las alcantarillas y las placas huellas. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 18 de Agosto de 2020 e informado a esta Secretaría Técnica el 09 de Noviembre de 2020.

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
BOLÍVAR	2018000020030	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIÓN ENTRE EL MAGDALENA MEDIO Y LA DESMEBOCADURA DEL RIO CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Redistribución de Costos	Ajuste No. 2. El ajuste consiste en la inclusión del ítem obras de dragado sin aprovechamiento de material para la construcción de un canal que permita la circulación de los Ferrys que van de San Pablo a Las Curumutas y que permita que la corriente principal transite más alejada de la orilla del municipio de San Pablo. Las obras de dragado con aprovechamiento de material disminuyen y serán realizadas para usar el material en el llenado de los Geocontenedores de cierre. Además se presentan ajustes en la ubicación de los espigones de acuerdo con las condiciones morfológicas, hidráulicas y sedimentológicas actuales. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 14 de Agosto de 2020 e informado a esta Secretaría Técnica el 04 de Noviembre de 2020.
ATLÁNTICO	2018000020058	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Redistribución de Costos	Ajuste No. 2. El ajuste corresponde a un balance de mayores y menores cantidades de obra luego de realizar las revisiones a los diseños iniciales. Se evidenciaron mayores cantidades en las actividades preliminares de cerramiento y valla informativa, así como aumento de las áreas de Demolición de Pavimento, Excavación, Rellenos, Solados, Redes Hidrosanitarias, entre otros. El capítulo de Espejo de Agua disminuye ya que no se realizará la construcción de esta estructura en el área de la Plaza del Municipio de Puerto Colombia atendiendo a la solicitud realizada por la Alcaldía del Municipio de no realizarla debido a los altos costos de mantenimiento de esta estructura .

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
CESAR	2018000020069	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CODAZZI- VÍA NACIONAL, ETAPA II, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Redistribución de Costos	Ajuste No. 2. El ajuste consiste en la necesidad de realizar obras hidráulicas tipo Box Couvert ya que se evidenció que en el corredor vial existen algunas obras hidráulicas como pontones en madera y lamina, que no cumplen con las especificaciones técnicas para este tipo de obras, no se adecuan a la sección transversal del proyecto diseñado, no presentan capacidad hidráulica para la evacuación de las escorrentías y no presentan capacidad estructural para el paso vehicular establecido en los diseños del proyecto. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 23 de Octubre de 2020 e informado a esta Secretaría Técnica el 20 de Noviembre de 2020.
	2019000020002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES Y BORDILLOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 2018	Redistribución de Costos	Ajuste No. 2. El ajuste se debe a la necesidad de instalar y/o reponer redes domiciliarias hidrosanitarias a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el RAS. En algunas vías en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello y Pelaya es necesario reducir el ancho de la calzada, ya que al momento de realizar el trazado y replanteo se evidenció que el ancho estimado en los diseños geométricos y en las memorias de cantidades contractuales las vías quedan dentro de la línea de propiedad de algunas casas. En el municipio de Pueblo Bello se hace necesario implementar unos muros para impedir la socavación de la banca de la vía, en la eventualidad en que el rio llegue a subir su nivel. Además, en algunos municipios se hace necesario profundizar las redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado que se encuentran a nivel de la estructura del pavimento. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 15 de Septiembre de 2020 e informado a esta Secretaría Técnica el 09 de Octubre de 2020.

8. INFORMACIÓN AL OCAD DE AJUSTES APROBADOS POR LOS EJECUTORES

EJECUTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
ATLÁNTICO	2019000020020	CONSTRUCCIÓN DE LA CONCHA ACÚSTICA DEPARTAMENTAL EN LA SEDE CULTURAL BANDA DE BARANOA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Redistribución de Costos	Ajuste No. 1. Los motivos que sustentan el ajuste son la inclusión de actividades no previstas y mayores y menores cantidades de obra teniendo en cuenta las conceptos de los especialistas estructurales en donde se concluyó incrementar las recomendaciones técnicas del concreto y el diseño de la estructura principal de la cubierta; con ocasión del cambio de material para la cubierta de la estructura principal ya que no fue factible utilizar la inicialmente diseñada por características de maleabilidad dentro de las opciones ofrecidas en el mercado.
FONVIVIENDA	2019000020092	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA, VIDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO	Cambio en la localización específica	Ajuste No. 1. FONVIVIENDA realizó una revisión detallada de la localización específica del proyecto encontrando la pertinencia de ampliar el número de polígonos y barrios para desarrollar la actividad de estudios técnicos que son correspondientes a la FASE II. La localización específica se ampliaría a los siguientes barrios: a. 12 de octubre, b. Porvenir, c. Villa sol, d. Villa María, e. Villa Adela 1, f. Juan Domínguez Romero, g. Salcedo, h. Ciudad bonita, i. 7 de agosto, j. La loma. El ajuste es extemporáneo siendo aprobado el 17 de Septiembre de 2020 e informado a esta Secretaría Técnica el 28 de Septiembre de 2020.
ATLÁNTICO	2019002080026	MEJORAMIENTO DE LA VIA CERRITO - HIBACHARO, MUNICIPIO DE PIOJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Redistribución de Costos	Ajuste No. 1. El ajuste se realiza por la necesidad de intervenir el tramo del K0+000 al K0+700 el cual se encuentra en condiciones intransitables, cuyos diseños se encuentran en el proyecto aprobado, con el fin de darle continuidad al hasta la Vía al Mar. Con la construcción del tramo se tendría una vía acorde con las necesidades del sector pasando de una vía estrecha sobre suelo natural a una vía debidamente conformada en pavimento flexible en donde podrán circular todo tipo de vehículos permitiendo la reactivación económica de la zona y mejorando las condiciones de comunicación entre las poblaciones de los municipios circunvecinos

9. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS

9. INFORMACIÓN AL OCAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS DEL DNP

ENTIDAD EJECUTORA	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTO DNP	
RIOHACHA (LA GUAJIRA)	2018002440080	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ACCESO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CUCURUMANA CON LA TRONCAL DEL CARIBE, DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Resolución 2560 del 30 de noviembre de 2020.	Expediente PAP-509-20. Por la cual se declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de la medida de suspensión preventiva de giros a un (1) proyecto de inversión ejecutado por el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha (La Guajira). dentro del Procedimiento Preventivo PAP-509-20, al no remitir los soportes que den cuenta del cumplimiento total y actualizado del plan de mejora formulado en relación con el proyecto de inversión.
MORROA (SUCRE)	2012000020042	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL EJE VIAL MONTES DE MARIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE MORROA CON EL MUNICIPIO DE COLOSO DEL K0+00 HASTA EL K21+387 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Resolución 2596 del 4 de diciembre de 2020	Expediente PAP-781-16. Por la cual se ordena el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros respecto de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías destinados a la financiación de un (1) proyecto de inversión ejecutado por el municipio de Morroa (Sucre), dentro del Procedimiento Preventivo PAP-781-16.
COVEÑAS (SUCRE)	2013000020049	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN COSTERA EN EL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE COVEÑAS Y SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE - REGIÓN CARIBE	Resolución No. 2437 del 22 de agosto de 2019.	Por la cual se decide el procedimiento correctivo y sancionatorio PACS234-15, adelantado en contra del municipio de Coveñas (Sucre) y su representante legal”, en la que se impuso la medida sancionatoria de desaprobación del proyecto con su consecuente devolución de recursos al municipio de Coveñas (Sucre), sobre el proyecto de inversión, con ocasión de las irregularidades probadas en el marco del procedimiento correctivo y sancionatorio PACS-234-15 y conforme lo establecido en los artículos 117 y 118 de la Ley 1530 de 2012

LIBERACIÓN TOTAL DE RECURSOS

ENTIDAD EJECUTORA	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR A LIBERAR	JUSTIFICACIÓN
COVEÑAS (SUCRE)	2013000020049	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN COSTERA EN EL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE COVEÑAS Y SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE - REGIÓN CARIBE	\$15.476.018.261,00 FDR \$14.996.018.261,00 RECURSOS PROPIOS – COVEÑAS \$240.000.000,00 RECURSOS PROPIOS – SANTIAGO DE TOLÚ \$240.000.000,00	FDR \$14.996.018.261,00	El artículo quinto de la Resolución 2437 del 22 de Agosto de 2019 impuso al municipio de Coveñas (Sucre) la medida sancionatoria de desaprobación de proyecto de inversión con su consecuente devolución de recursos por valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. \$14.996.018.261,00, correspondiente al valor total girado para la financiación del proyecto de inversión, en los términos del artículo 118 de la Ley 1530 de 2012

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

A todos
los que trabajan
por el Caribe.

¡Gracias!
